Реализация регионального приоритетного проекта «Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

Буцкая Екатерина Владимировна

Министр финансов Ульяновской области

Региональный приоритетный проект «Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

Итоги:

258 проектов

Свыше 500 тысяч сельских жителей

Общая сумма финансирования более **350,0 млн.рублей**

Региональный приоритетный проект «Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

Структура управления приоритетного проекта

Куратор проекта – Заместитель Губернатора

Руководитель проекта – Министр финансов Ульяновской области

Комиссия по проведению конкурсного отбора проектов развития МО, подготовленных на основе местных инициатив граждан

Проектный комитет

Проектная команда

Паспорт

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Ульяновской области
_____ С.И.Морозов
18 [illegible]

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	поддержка местных инициатив	Срок начала и окончания проекта	01.2017-31.12.2019
Куратор	Первый заместитель Губернатора Ульяновской области – А.И.Якушин		
Функциональный заказчик	Министерство финансов Ульяновской области		
Руководитель проекта	Министр финансов Ульяновской области – Е.В.Буцкая		
Ключевые участники проекта	Советники Первого заместителя Губернатора Ульяновской области на общественных началах по вопросам взаимодействия с муниципальными образованиями Ульяновской области; Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области; Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области; Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; Члены комиссии по проведению ежегодного конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных		

Документация Проекта

Сводный план

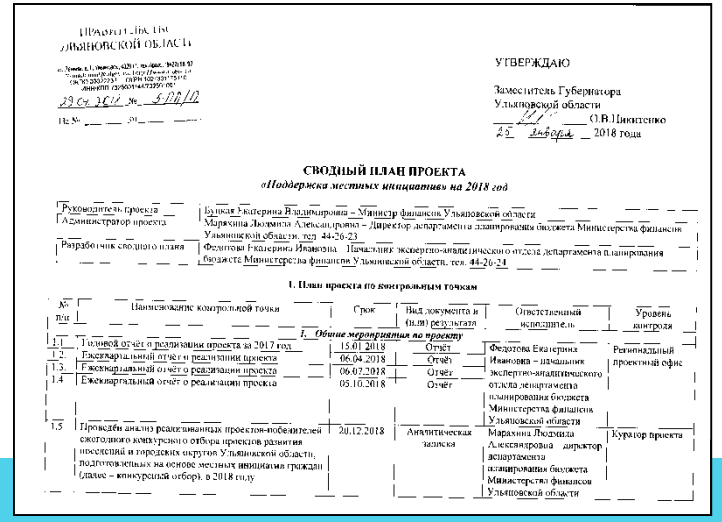

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2018 № 5-ПП/П

На № ____ от ____

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Ульяновской области
_____ О.В.Никитенко
25 января 2018 года

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
«Поддержка местных инициатив» на 2018 год

Руководитель проекта	Буцкая Екатерина Владимировна – Министр финансов Ульяновской области
Администратор проекта	Марахина Людмила Александровна – Директор департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области, тел. 44-26-23
Разработчик сводного плана	Федотова Екатерина Ивановна – Начальник экспертно-аналитического отдела департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области, тел. 44-26-24

I. План проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	I. Общие мероприятия по проекту				
1.1	Годовой отчёт о реализации проекта за 2017 год	15.01.2018	Отчёт	Федотова Екатерина Ивановна – начальник экспертно-аналитического отдела департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области	Региональный проектный офис
1.2.	Ежеквартальный отчёт о реализации проекта	06.04.2018	Отчёт		
1.3.	Ежеквартальный отчёт о реализации проекта	06.07.2018	Отчёт		
1.4	Ежеквартальный отчёт о реализации проекта	05.10.2018	Отчёт		
1.5	Проведён анализ реализованных проектов-победителей ежегодного конкурсного отбора проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан (далее – конкурсный отбор), в 2018 году	20.12.2018	Аналитическая записка	Марахина Людмила Александровна директор департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области	Куратор проекта

Региональный приоритетный проект «Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

Проблемы

Недостаточное информирование населения о Проекте

Не своевременный сбор денежных средств с хозяйствующих субъектов

Решение

✓ Медиа-план проекта
✓ Увеличение бальной оценки за информирование населения о проекте



УТВЕРЖДАЮ
Министр финансов
Ульяновской области
_____ Е.В. Буцкая
15 февраля 2018 г.

МЕДИАПЛАН по информированию населения через СМИ и сюжети о реализации регионального приоритетного проекта «Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

Период реализации – январь - декабрь 2018 года.

Ответственный исполнитель – пресс-служба Правительства и Губернатора Ульяновской области, пресс-служба Министерства финансов Ульяновской области и пресс-службы других ведомств, муниципальные образования Ульяновской области

Основной акцент – реализация на территории Ульяновской области Проекта поддержки местных инициатив

Основной спикер – Губернатор С.И. Морозов, Министр финансов Е.В. Буцкая.

Дата	Тема	Форма подачи	СМИ	Спикеры	Статус выполнения	Ответственный
19.01.2018	Ульяновцев приглашают выбрать логотип для Проекта поддержки местных инициатив	Информационное сообщение	Сайт Министерства финансов Ульяновской области, информационный портал «Ульяновская правда», рассылка в региональные и местных СМИ, официальные страницы Министерства финансов в социальных сетях: «Twitter», «Facebook», «Вконтакте»	Министр финансов Ульяновской области Е.В. Буцкая	Выполнен	Пресс-секретарь Министерства финансов Ульяновской области Е.А. Жукова
30.01.2018	Подведены итоги	Информационное	Сайт Министерства		Выполнен	Пресс-секретарь

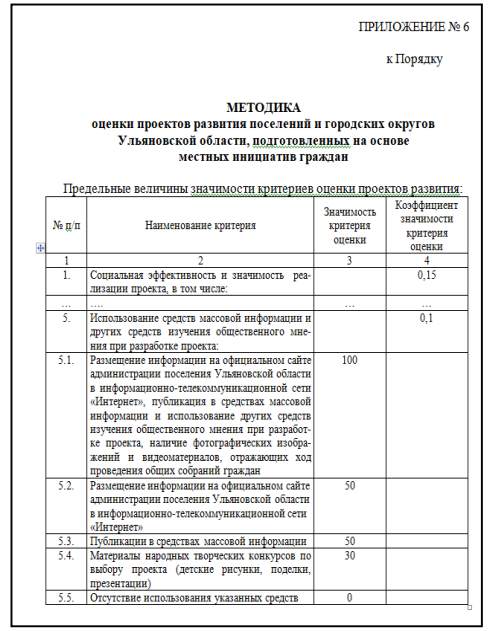

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку

МЕТОДИКА
оценки проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан

Предельные величины значимости критериев оценки проектов развития:

№ п/п	Наименование критерия	Значимость критерия оценки	Коэффициент значимости критерия оценки
1	2	3	4
1.	Социальная эффективность и значимость реализации проекта, в том числе:		0,15
…	….	…	…
5.	Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта:		0,1
5.1.	Размещение информации на официальном сайте администрации поселения Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикация в средствах массовой информации и использование других средств изучения общественного мнения при разработке проекта, наличие фотографических изображений и видеоматериалов, отражающих ход проведения общих собраний граждан	100	
5.2.	Размещение информации на официальном сайте администрации поселения Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	50	
5.3.	Публикации в средствах массовой информации	50	
5.4.	Материалы народных творческих конкурсов по выбору проекта (детские рисунки, поделки, презентации)	30	
5.5.	Отсутствие использования указанных средств	0	

✓ Увеличение срока софинансирования для ЮЛ на 76 дней

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ по региональным проектам

Проект	Примечание
Перевод услуг в электронный вид	
Создание и сохранение семей	
Поддержка местных инициатив	
Потребительская кооперация	
Снижение смертности от социально-значимых заболеваний	
Ковровая дорожка	
Повышение эффективности бюджетных расходов	
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни	
Инновационный кластер	
Повышение рождаемости	

2017 год

Итоги реализации

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ по региональным проектам

Проект	Среднее	Место	
		В целом	По группе
Развитие наставничества	118,4%	2	1
Десятилетие доброты	116,7%	3	2
Развитие инновационного кластера	112,5%	4	3
Потребительская кооперация	112,1%	5	4
Перевод услуг в электронный вид	100%	9	5
Поддержка местных инициатив	100%	9	5
Развитие ИТ-индустрии	100%	9	5
Ковровая дорожка	100%	9	5
Снижение смертности от соц-значимых заболеваний	98,7%	17	9
Развитие креативных индустрий	96,3%	19	10
Увеличение продолжительности жизни	96,3%	19	10
Создание и сохранение семей	88,9%	23	12
Повышение рождаемости	86,9%	24	13

1 пол-е 2018 года

Региональный приоритетный проект «Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

Автоматизированная информационная система управления проектной деятельностью Ульяновской области (АИС УП)

Календарный план

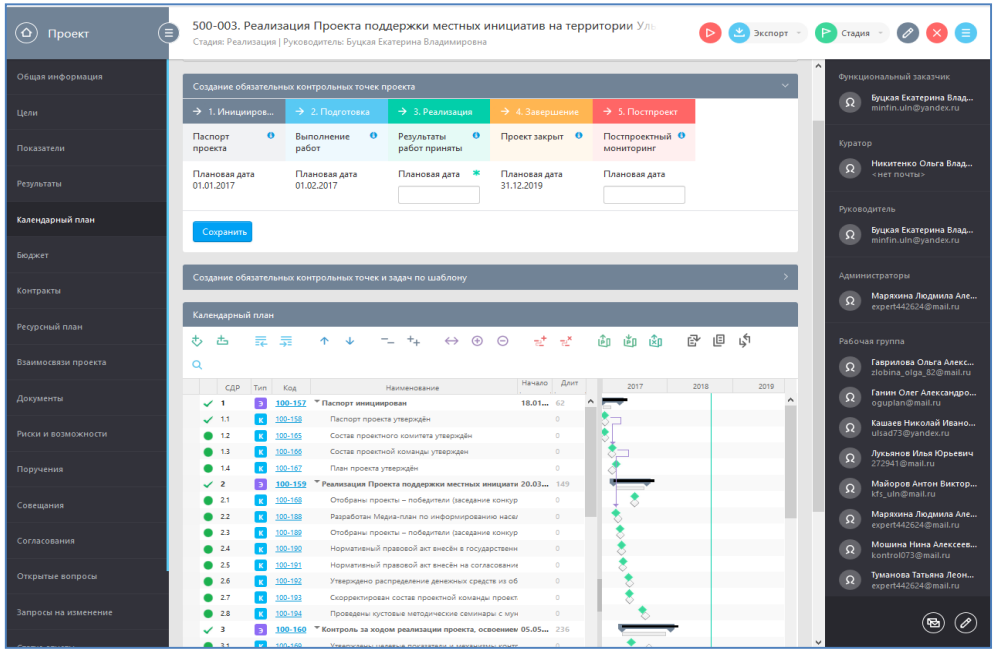

Бюджет проекта

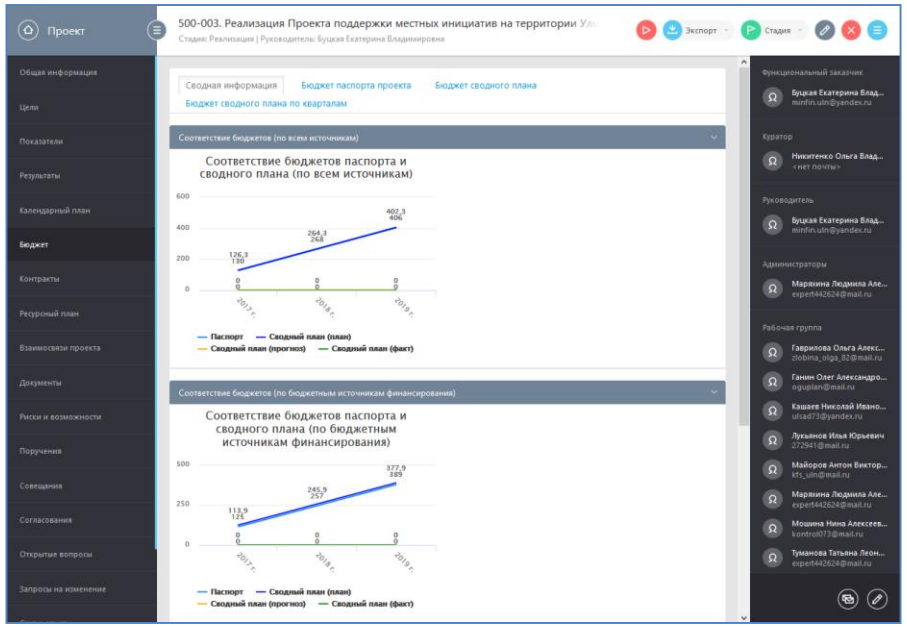

Региональный приоритетный проект «Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

2018

✓Увеличение финансирования проекта:
до 120 млн.рублей

✓ Изменение уровня софинансирования для городского поселения:
со стороны **населения**
не менее 7% (было 12%);
со стороны бюджета **поселения**
не менее 12% (было 10%)

✓ Расширен перечень участников
МО Уо, на территории которых зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан в части строительства или реконструкции автомобильных дорог, ведущих к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан

2019

✓ Увеличение финансирования проекта:
до 150 млн.рублей

✓Объём субсидии, предоставляемой бюджету одного муниципального образования Ульяновской области:
увеличен до 3 млн. рублей.
